

สรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นำเสนอโดย...งานออกแบบและผังแม่บท

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม



ครั้งที่ 3/ 2566 วันที่ 14 มิ.ย. 2566

สรุป ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงก่อสร้าง

ลำดับที่	แผนงาน/กลยุทธ์/โครงการ	วงเงินจัดจ้าง(บาท)	ผู้รับจ้าง	ระยะเวลาสัญญา	เริ่มสัญญาและสิ้นสุด	ความก้าวหน้าที่ทำได้นี้	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงกำแพงกันน้ำบริเวณ MU CORNER งบปี 2566	1,260,000.00	บริษัท เคคิว ดีเวอเปเมนท์ จำกัด	150 วัน	รอนัดประชุมเพื่อเริ่มงาน		อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
2	โครงการจัดสวนลานหน้าหอสมุดเดิม งบปี 2565	8,929,000.00	กิจการร่วมค้า เลิศธระ สิริ	210 วัน	เริ่ม 1/6/65 สิ้นสุด 27/12/65	100.00%	แล้วเสร็จ รอเก็บความเรียบร้อย
3	โครงการซ่อมแซมถนนและทางเท้าภายในมหาวิทยาลัยมหิดล งบปี 2565	1,730,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนภูมิเอ็นจิเนียริง	150 วัน	เริ่ม 1/12/65 สิ้นสุด 29/4/66	100.00%	แล้วเสร็จ
4	โครงการงานปรับปรุงสระน้ำหลังอาคารสำนักงานอธิการบดีเป็นพื้นที่สีเขียว งบปี 2565	4,120,295.12	กิจการร่วมค้า พลแสน สิริ	180 วัน	เริ่ม 18/4/65 สิ้นสุด 14/10/65	100.00%	แล้วเสร็จ รอส่งมอบงาน
5	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ทำ E-SPORT (งบ DCU)	45,000,000.00	บริษัท วรากิจ จำกัด	270 วัน	เริ่ม 29/11/64 สิ้นสุด 25/8/65	100.00%	แล้วเสร็จ รอเก็บความเรียบร้อย
6	โครงการปรับปรุงห้องน้ำด้านข้างอาคารเอนกประสงค์ (งบ DCU)	3,720,000.00	บริษัท เคคิว ดีเวอเปเมนท์ จำกัด	180 วัน	เริ่ม 20/2/66 สิ้นสุด 18/8/66	18.04%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
7	โครงการปรับปรุง กองเทคโนโลยีสารสนเทศ	21,300,000.00	กิจการร่วมค้า เลิศธระ สิริ	270 วัน	เริ่ม 1/11/65 สิ้นสุด 28/7/66	0.92%	ยกเลิกสัญญาเมื่อ 3 พ.ค. 2566
8	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล	21,033,000.00	บริษัท เค แอล พี กรุ๊ป จำกัด	210 วัน	เริ่ม 13/11/64 สิ้นสุด 10/6/65	55.62%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
9	โครงการหลังคาและพื้นสนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง	4,800,000.00	บริษัท เค แอล พี กรุ๊ป จำกัด	180 วัน	เริ่ม 1/10/65 สิ้นสุด 7/4/66	24.98%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
10	โครงการศูนย์เรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์สำหรับเด็กวัยเรียน (อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ)	14,600,000.00	บริษัท ทรี บี เอส จำกัด	180 วัน	เริ่ม 15/8/65 สิ้นสุด 10/2/66	97.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
11	โครงการศาลาเอนกประสงค์ (อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ)	2,836,000.00	บริษัท หงษ์ทอง การช่าง 201 จำกัด	90 วัน	เริ่ม 12/10/65 สิ้นสุด 14/1/66	100.00%	แล้วเสร็จ
12	โครงการก่อสร้างเพาะ خاکกล้าไม้ (อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ)	8,370,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ ดู กรีน แอนด์ เอ็นจิเนียริง	300 วัน	เริ่ม 16/10/63 สิ้นสุด 24/1/65	99.21%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
13	โครงการปรับปรุงอาคารสถาบันวัฒนธรรมการเรียนรู้ (สถาบันวัฒนธรรม)	47,800,000.00	บริษัท สุกกร วิศวกรรม จำกัด	240 วัน	เริ่ม 1/11/65 สิ้นสุด 28/6/66	28.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
14	โครงการปรับปรุงอาคารวิจัยทางคลินิกเพื่อการอบรมและสอนสาธิตด้านอาหาร (สถาบันโภชนาการ)	20,600,000.00	บริษัท ต้นโพธิ์ ก่อสร้าง จำกัด	250 วัน	เริ่ม 19/12/65 สิ้นสุด 25/8/66	8.60%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
15	โครงการอาคารโรงงานต้นแบบมาตรฐาน GMP (สถาบันโภชนาการ)	21,800,000.00	บริษัท ต้นโพธิ์ ก่อสร้าง จำกัด	300 วัน	เริ่ม 15/2/66 สิ้นสุด 11/12/66	5.25%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
16	โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ระยะ 2 (สถาบันชีวโมเลกุล)	33,850,000.00	บริษัท ที คิว อี จำกัด	240 วัน	เริ่ม 25/10/65 สิ้นสุด 21/6/66	17.68%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
17	โครงการห้องปฏิบัติการเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ด้านการผลิตและพัฒนาชีววัตถุและวัคซีน	50,700,000.00	บริษัท โกลบอลเทค จำกัด	180 วัน	เริ่ม 25/10/65 สิ้นสุด 22/4/66	43.65%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
18	โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรมกึ่งและห้องปฏิบัติการ	17,350,000.00	บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด	360 วัน	เริ่ม 29/8/65 สิ้นสุด 23/8/66	52.58%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
19	โครงการก่อสร้างปรับปรุงชุดห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลระดับ 3 ส่วนงานขนย้าย งานรีดถนน งานกันฝน	5,665,961.00	บริษัท เยอรมันลิฟท์ จำกัด	150 วัน	เริ่ม 8/7/65 สิ้นสุด 4/12/66	47.30%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

1. ขอบตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท
2. วงเงินจัดจ้าง	1,260,000 บาท
3. สัญญาจ้าง	สัญญาเริ่มวันที่ เมษายน 2564 แล้วเสร็จวันที่กรกฎาคม 2564
4. ผู้รับจ้าง	บริษัท เค ดีว เดเวลอปเมนต์ จำกัด
5. ระยะเวลาก่อสร้าง	150 วัน
6. ผลการดำเนินงาน	ณ ปัจจุบัน รอ kick off เพื่อเริ่มงานก่อสร้าง (ผนัง ค.ส.ล. ยาวประมาณ 87 เมตร)
7. ผลสำเร็จที่ได้รับ	ได้กำแพงกันน้ำบริเวณ MU CORNER

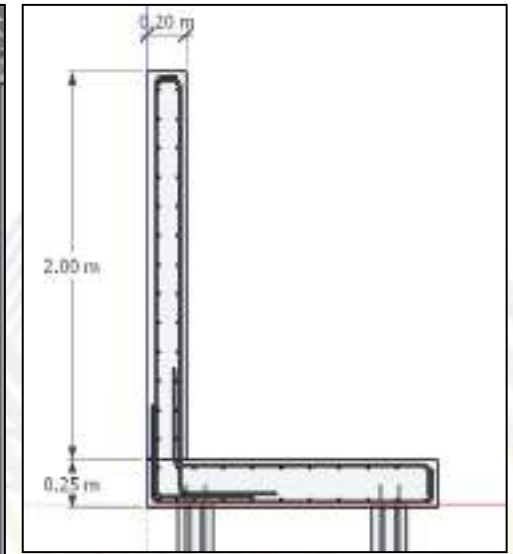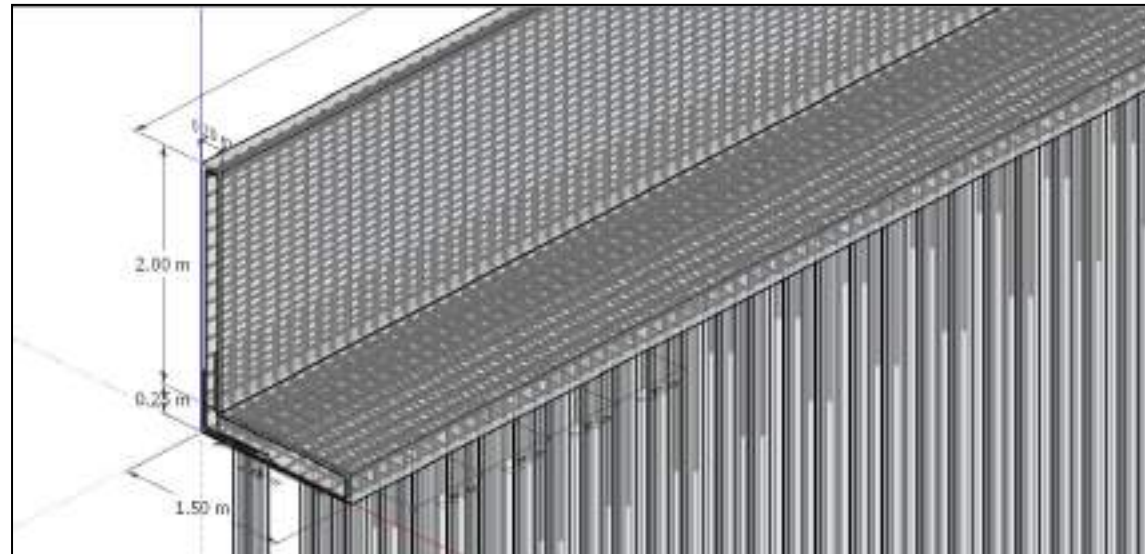

รายละเอียดโครงการ


1. ขอบตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
2. วงเงินจัดจ้าง	8,929,000 บาท
3. สัญญาจ้าง	เลขที่ C 4010001372 (OP) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 (ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน)
4. ผู้รับจ้าง	กิจการร่วมค้า เลิศธีระ สิริ
5. ระยะเวลาก่อสร้าง	210 วัน
6. ผลการดำเนินงาน	เริ่มงาน 1-6-2565 สิ้นสุด 27-12-2565 หน้างาน ณ ปัจจุบันประมาณ 100% ปัจจุบันส่งงานงวดสุดท้ายมาแล้วรอบประชุม คณะกรรมการและแก้ไขงานที่ไม่เรียบร้อย
7. ผลสำเร็จที่ได้รับ	ได้สวนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรสำหรับ พักผ่อนหย่อนใจ







รายละเอียดโครงการ

1. ขอบตั้งงบประมาณ บาท
2. วงเงินจัดจ้าง	1,730,000 บาท
3. สัญญาจ้าง	เลขที่ C 4010001372 (OP) สัญญาเริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 29 เมษายน 2566 (ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน)
4. ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง
5. ระยะเวลาก่อสร้าง	150 วัน
6. ผลการดำเนินงาน	<p>หน้างาน ณ ปัจจุบันประมาณ 100% ปัจจุบันส่งงานงวดสุดท้ายมาแล้วรอบประชุม คณะกรรมการและแก้ไขงานที่ไม่เรียบร้อย</p> 
7. ผลสำเร็จที่ได้รับ	ได้ทางม้าลาย ทางเดินเท้า และทางจักรยาน เพื่อ อำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาและบุคลากร




รายละเอียดโครงการ

1. ขอบตั้งงบประมาณ บาท
2. วงเงินจัดจ้างบาท
3. สัญญาจ้าง	เลขที่ C 4010001372 (OP) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 (ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน)
4. ผู้รับจ้าง	กิจการร่วมค้า เลิศธีระ สิริ
5. ระยะเวลาก่อสร้าง	210 วัน
6. ผลการดำเนินงาน	เริ่มงาน 1-6-2565 สิ้นสุด 27-12-2565 หน้างาน ณ ปัจจุบันประมาณ 100% ปัจจุบันส่งงานงวดสุดท้ายมาแล้วรอบประชุม คณะกรรมการและแก้ไขงานที่ไม่เรียบร้อย
7. ผลสำเร็จที่ได้รับ	ได้สวนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรสำหรับ พักผ่อนหย่อนใจ




รายละเอียดโครงการ

1. ขอบตั้งงบประมาณ	ประมาณ 55 ล้านบาท
2. วงเงินจัดจ้าง	44,788,000 บาท
3. สัญญาจ้าง	เลขที่ C 4010001309 (OP) สัญญาเริ่มวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 แล้วเสร็จวันที่ 25 สิงหาคม 2565 (ระยะเวลาก่อสร้าง 270 วัน)
4. ผู้รับจ้าง	บริษัท วราก็จ จำกัด
5. ระยะเวลาก่อสร้าง	270 วัน
6. ผลการดำเนินงาน	<p>หน้างาน ณ ปัจจุบันประมาณ 100%</p> <p>ปัจจุบันส่งงานงวดสุดท้ายมาแล้วรอบประชุมคณะกรรมการและแก้ไขงานที่ไม่เรียบร้อย</p> 
7. ผลสำเร็จที่ได้รับ	ได้อาคารเอนกประสงค์ สำหรับจัดกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร




6. โครงการปรับปรุงห้องน้ำบริเวณด้านข้างอาคารเอนกประสงค์ (อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการก่อสร้าง)

รายละเอียดโครงการ

1. ขอบตั้งงบประมาณ	4.5 ล้านบาท
2. วงเงินจัดจ้าง	3,720,000 บาท
3. สัญญาจ้าง	เลขที่ C 4010001440 (OP) สัญญาเริ่มวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วเสร็จวันที่ 18 สิงหาคม 2566 (ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน)
4. ผู้รับจ้าง	บริษัท เคคิว ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
5. ระยะเวลาก่อสร้าง	180 วัน
6. ผลการดำเนินงาน	<p>หน้างาน ณ ปัจจุบันประมาณ 18.04% ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนผูกเหล็กเทคาน เท พื้น ค.ส.ล.</p> 
7. ผลสำเร็จที่ได้รับ	ได้ห้องน้ำด้านข้างอาคารเอนกประสงค์ สำหรับ นักศึกษาและบุคลากรที่มาเล่นกีฬา




รายละเอียดโครงการ

1. ขอบตั้งงบประมาณ	ประมาณ 55 ล้านบาท
2. วงเงินจัดจ้าง	21,300,000 บาท
3. สัญญาจ้าง	เลขที่ C 4010001415 (IL) สัญญาเริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 แล้วเสร็จวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 (ระยะเวลาก่อสร้าง 270 วัน)
4. ผู้รับจ้าง	กิจการร่วมค้า เลิศธีระ สิริ
5. ระยะเวลาก่อสร้าง	270 วัน
6. ผลการดำเนินงาน	<p>หน้างาน ณ ปัจจุบันผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้ตามระยะเวลา และมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นควรบอกเลิกสัญญา เพื่อหาผู้รับจ้างเจ้าใหม่เพื่อดำเนินการต่อไป</p> 
7. ผลสำเร็จที่ได้รับ	ได้กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล (พื้นที่ศาลายาและพญาไท)



รายละเอียดโครงการ

1. ขอบตั้งงบประมาณ	ประมาณ 27 ล้านบาท
2. วงเงินจัดจ้าง	21,033,000 บาท
3. สัญญาจ้าง	เลขที่ C 417000063 (SP) สัญญาเริ่มวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 แล้วเสร็จวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน)
4. ผู้รับจ้าง	บริษัท เค แอล พี กรุ๊ป จำกัด
5. ระยะเวลาก่อสร้าง	210 วัน
6. ผลการดำเนินงาน	หน้างาน ณ ปัจจุบันประมาณ 47.03 % ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้งหลังคาไว้ โครงสร้าง
7. ผลสำเร็จที่ได้รับ	ได้สนามกีฬาในร่มสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ที่มาเล่นกีฬา

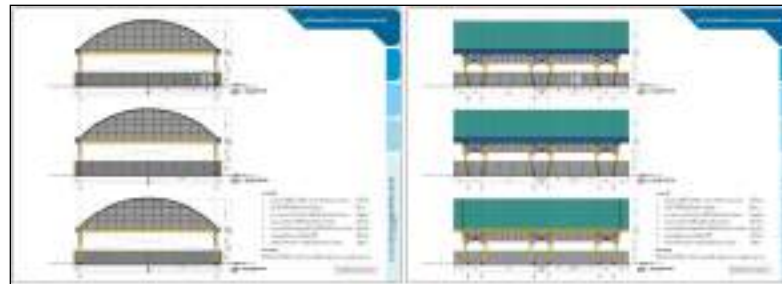

9. โครงการหลังคาและพื้นสนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง(อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)

รายละเอียดโครงการ

1. ขอบตั้งงบประมาณ	ประมาณ 5.17 ล้านบาท
2. วงเงินจัดจ้าง	4,800,000 บาท
3. สัญญาจ้าง	เลขที่ C 4010001400 (OP) สัญญาเริ่มวันที่ 10 ตุลาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 (ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน)
4. ผู้รับจ้าง	บริษัท เค แอล พี กรุ๊ป จำกัด
5. ระยะเวลาก่อสร้าง	180 วัน
6. ผลการดำเนินงาน	หน้างาน ณ ปัจจุบันประมาณ % ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้งโครงสร้าง เหล็กรูปพรรณ
7. ผลสำเร็จที่ได้รับ	ได้สนามกีฬา วอลเลย์บอล ในร่มสำหรับนักศึกษาและ บุคลากรที่มาเล่นกีฬา




10. โครงการศูนย์เรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ในวัยเรียน Botanical Playground(อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)


รายละเอียดโครงการ

1. ขอบตั้งงบประมาณ	ประมาณ ล้านบาท
2. วงเงินจัดจ้าง	14,600,000 บาท
3. สัญญาจ้าง	เลขที่ C 4490000011 (OP) สัญญาเริ่มวันที่ 15 สิงหาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 (ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน)
4. ผู้รับจ้าง	บริษัท ทรี บี เอส จำกัด
5. ระยะเวลาก่อสร้าง	180 วัน (6 งวดงาน)
6. ผลการดำเนินงาน	หน้างาน ณ ปัจจุบันส่งงานงวด 4 แล้วเหลืออีกสองงวดงาน
7. ผลสำเร็จที่ได้รับ	ปรับปรุงพื้นที่ในอุทยานธรรมชาติสิริรุกชาติเพื่อรองรับการใช้งานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต





รายละเอียดโครงการ

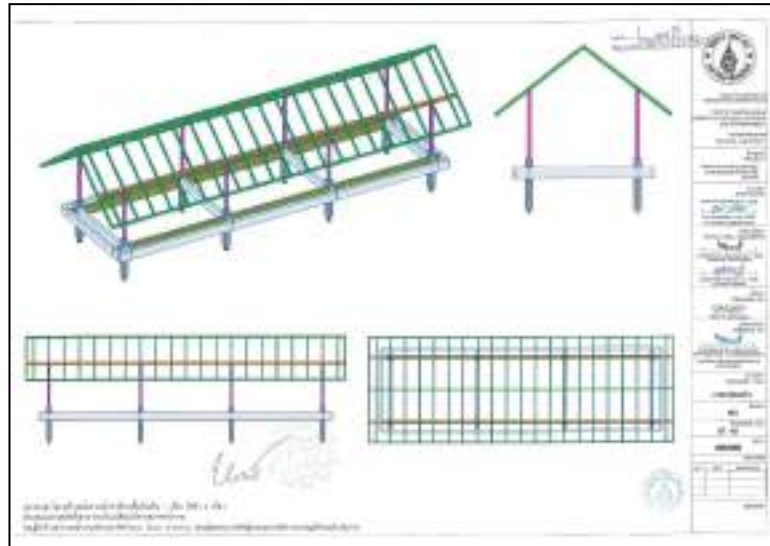1. ขอบตั้งงบประมาณ	ประมาณ 4.2 ล้านบาท
2. วงเงินจัดจ้าง	2,836,000 บาท
3. สัญญาจ้าง	เลขที่ C 4490000015 (OP) สัญญาเริ่มวันที่ 17 ตุลาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 14 มกราคม 2566 (ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน)
4. ผู้รับจ้าง	บริษัท หงส์ทอง จำกัด
5. ระยะเวลาก่อสร้าง	90 วัน
6. ผลการดำเนินงาน	<p>หน้างาน ณ ปัจจุบันประมาณ 100% ปัจจุบันส่งงานงวดสุดท้ายแล้ว</p> 
7. ผลสำเร็จที่ได้รับ	ได้ศาลาเอนกประสงค์ สำหรับจัดกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 2 หลัง



รายละเอียดโครงการ

1. ขอบตั้งงบประมาณ	
2. วงเงินจัดจ้าง	8,370,000 บาท
3. สัญญาจ้าง	เลขที่ C 4010001161 (OP) สัญญาเริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2563 แล้วเสร็จวันที่ 24 มกราคม 2565 (ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน)
4. ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ ดู กรีน แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
5. ระยะเวลาก่อสร้าง	300 วัน
6. ผลการดำเนินงาน	<p>หน้างาน ณ ปัจจุบันประมาณ 99.21% รอส่งงานงวดสุดท้ายแล้ว</p> 
7. ผลสำเร็จที่ได้รับ	ได้ศาลาเอนกประสงค์ สำหรับจัดกิจกรรมของ นักศึกษาและบุคลากร จำนวน 2 หลัง




รายละเอียดโครงการ


1. ขอบตั้งงบประมาณ	
2. วงเงินจัดจ้าง	47,800,000 บาท
3. สัญญาจ้าง	เลขที่ C 4348000001 (IL) สัญญาเริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 แล้วเสร็จวันที่ 25 มิถุนายน 2566 (ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน)
4. ผู้รับจ้าง	บริษัท ศุภกร วิศวกรรมศิลป์ จำกัด
5. ระยะเวลาก่อสร้าง	240 วัน
6. ผลการดำเนินงาน	หน้างาน ณ ปัจจุบันประมาณ 28%
7. ผลสำเร็จที่ได้รับ	ได้อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่เพื่อรองรับ การใช้งานในอนาคต




14. โครงการปรับปรุงอาคารวิจัยทางคลินิกเพื่อการอบรมและสอนสาธิตด้านอาหาร(อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)

รายละเอียดโครงการ

1. ขอบตั้งงบประมาณ	
2. วงเงินจัดจ้าง	20,600,000 บาท
3. สัญญาจ้าง	เลขที่ 4210000209 สัญญาเริ่มวันที่ 19 ธันวาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 25 สิงหาคม 2566 (ระยะเวลาก่อสร้าง 250 วัน)
4. ผู้รับจ้าง	บริษัท ต้นโพธิ์ ก่อสร้าง จำกัด
5. ระยะเวลาก่อสร้าง	250 วัน
6. ผลการดำเนินงาน	<p>หน้างาน ณ ปัจจุบันประมาณ 8.60%</p> 
7. ผลสำเร็จที่ได้รับ	ได้อาคารอาคารวิจัยทางคลินิกเพื่อการอบรมและสอนสาธิตด้านอาหารเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต




รายละเอียดโครงการ

1. ขอบตั้งงบประมาณ	
2. วงเงินจัดจ้าง	21,800,000 บาท
3. สัญญาจ้าง	เลขที่ 4210000213 สัญญาเริ่มวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วเสร็จวันที่ 11 ธันวาคม 2566 (ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน)
4. ผู้รับจ้าง	บริษัท ต้นโพธิ์ ก่อสร้าง จำกัด
5. ระยะเวลาก่อสร้าง	300 วัน
6. ผลการดำเนินงาน	หน้างาน ณ ปัจจุบันประมาณ 5.25%
	
7. ผลสำเร็จที่ได้รับ	ได้อาคารโรงงานต้นแบบมาตรฐาน GMPเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต




รายละเอียดโครงการ

1. ขอบตั้งงบประมาณ	
2. วงเงินจัดจ้าง	33,850,000 บาท
3. สัญญาจ้าง	เลขที่ C 4220000118 (MB) สัญญาเริ่มวันที่ 25 ตุลาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 21 มิถุนายน 2566 (ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน)
4. ผู้รับจ้าง	บริษัท ที คิว อี จำกัด
5. ระยะเวลาก่อสร้าง	240 วัน
6. ผลการดำเนินงาน	หน้างาน ณ ปัจจุบันประมาณ 17.68%
	
7. ผลสำเร็จที่ได้รับ	ได้อาคารวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต



17. โครงการห้องปฏิบัติการเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ด้านการผลิตและพัฒนาชีววัตถุและวัคซีน (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)

รายละเอียดโครงการ

1. ขอบตั้งงบประมาณ	
2. วงเงินจัดจ้าง	50,700,000 บาท
3. สัญญาจ้าง	เลขที่ C 4220000119 (MB) สัญญาเริ่มวันที่ 25 ตุลาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 22 เมษายน 2566 (ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน)
4. ผู้รับจ้าง	บริษัท โกลบอลเทค จำกัด
5. ระยะเวลาก่อสร้าง	180 วัน
6. ผลการดำเนินงาน	หน้างาน ณ ปัจจุบันประมาณ 43.65 %
	
7. ผลสำเร็จที่ได้รับ	ได้ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ด้านการผลิตและพัฒนาชีววัตถุและวัคซีนเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต



18. โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรมกุ้งและห้องปฏิบัติการ (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)

รายละเอียดโครงการ

1. ขอบตั้งงบประมาณ	
2. วงเงินจัดจ้าง	17,350,000 บาท
3. สัญญาจ้าง	เลขที่ C 4220000112 (MB) สัญญาเริ่มวันที่ 29 สิงหาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 23 สิงหาคม 2566 (ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน)
4. ผู้รับจ้าง	บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
5. ระยะเวลาก่อสร้าง	360 วัน
6. ผลการดำเนินงาน	หน้างาน ณ ปัจจุบันประมาณ 52.58 %
7. ผลสำเร็จที่ได้รับ	ได้โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรมกุ้งและห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต



รายละเอียดโครงการ

1. ขอบตั้งงบประมาณ	
2. วงเงินจัดจ้าง	5,665,961 บาท
3. สัญญาจ้าง	เลขที่ C 4220000108 (MB) สัญญาเริ่มวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 4 ธันวาคม 2565 (ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน)
4. ผู้รับจ้าง	บริษัท เยอรมัน ลิฟต์ จำกัด
5. ระยะเวลาก่อสร้าง	150 วัน
6. ผลการดำเนินงาน	หน้างาน ณ ปัจจุบันประมาณ 47.30 %



7. ผลสำเร็จที่ได้รับ

ได้โครงการก่อสร้างปรับปรุงชุดห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 ส่วนงานขนย้าย งานรื้อถอน งานกันผนัง ลิฟต์ขนของและโดยสาร บันไดหนีไฟ



จบการนำเสนอ

