



มหาวิทยาลัยมหิดล

# โครงการปรับปรุงทางเดินเท้ามีหลังคาคลุม (Cover way)






## รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ	: โครงการปรับปรุงทางเดินเท้ามีหลังคาคลุม (Cover way)
งบประมาณก่อสร้าง	: 19,629,309.34 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	: 260 วัน
ผู้รับจ้าง	: บริษัท ปิยะพัฒนกิจก่อสร้าง จำกัด
วันที่เริ่มสัญญา	: 26 เมษายน 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา	: 10 มกราคม 2562



# การดำเนินงานระยะที่ 1

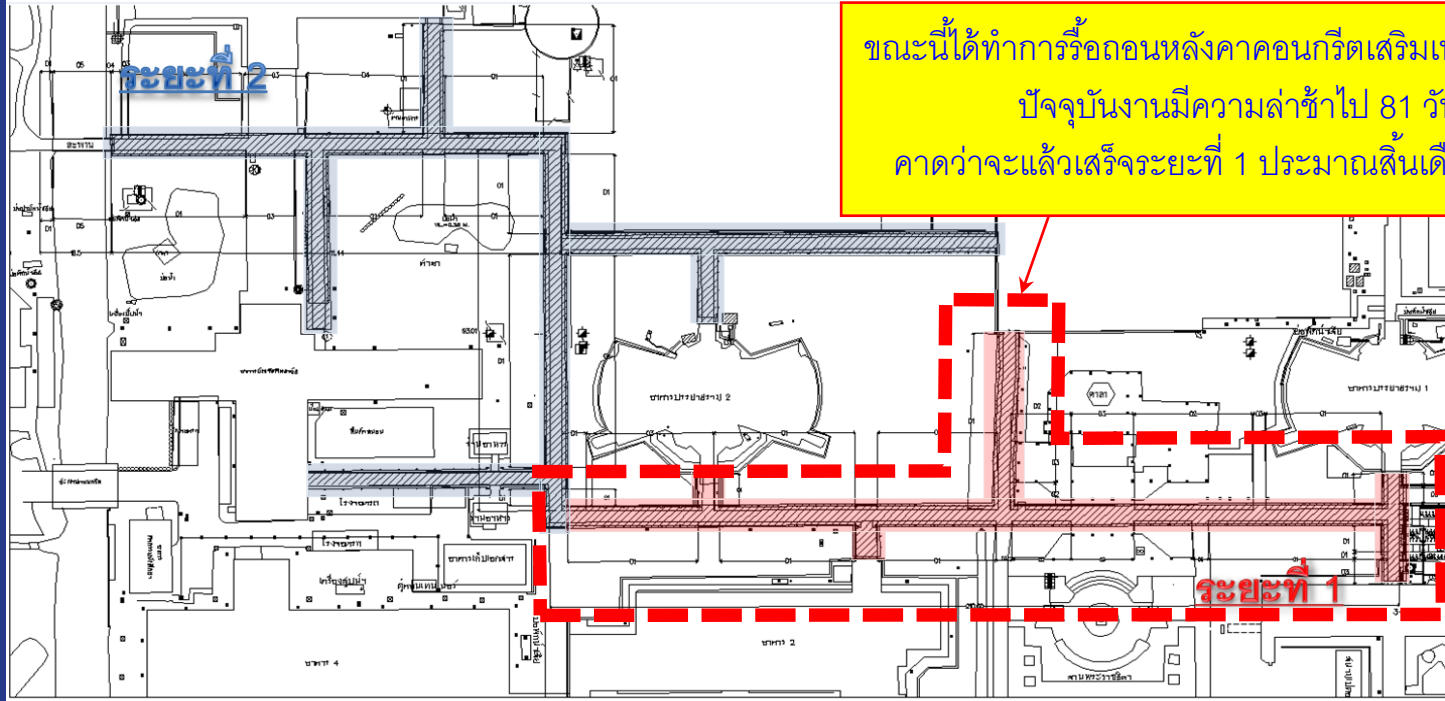


ขณะนี้ได้ทำการรื้อถอนหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ  
ปัจจุบันงานมีความล่าช้าไป 81 วัน  
คาดว่าจะแล้วเสร็จระยะที่ 1 ประมาณสิ้นเดือนตุลาคม





# แผนการดำเนินงานระยะที่ 2

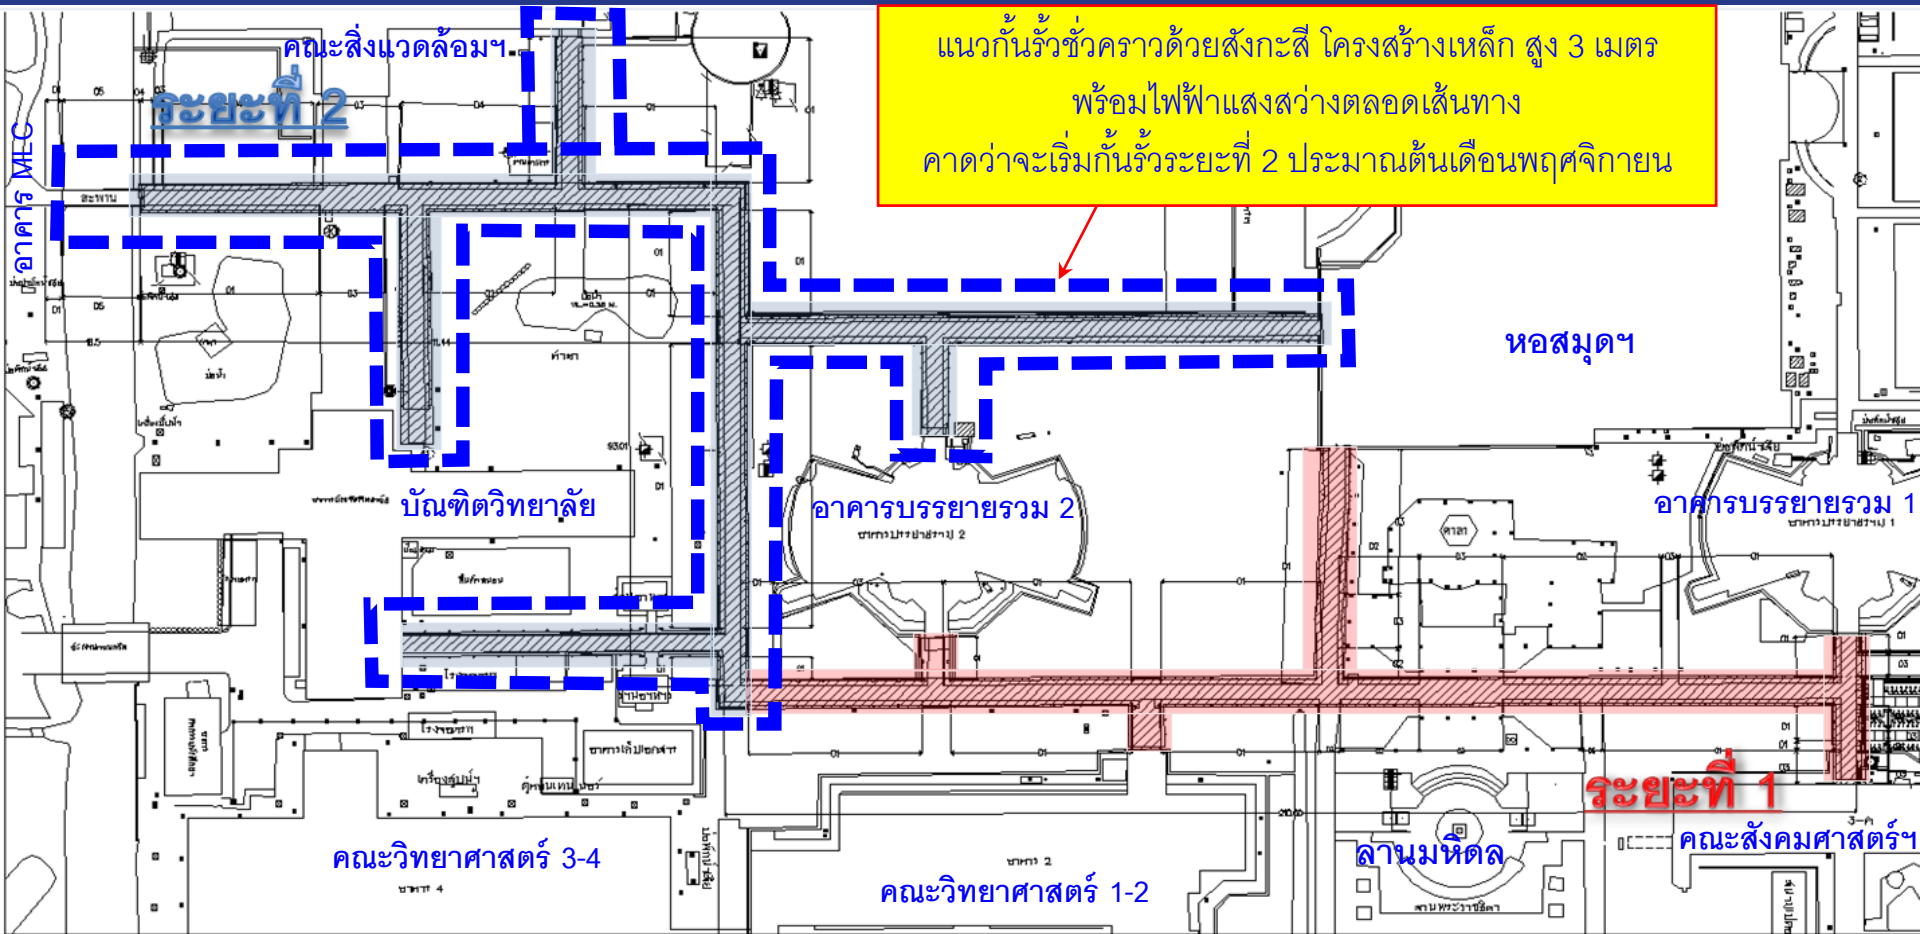

แสงรั้วชั่วคราวด้วยสังกะสี โครงสร้างเหล็ก สูง 3 เมตร  
พร้อมไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง  
คาดว่าจะเริ่มกันรั้วระยะที่ 2 ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน

--- แสงรั้วชั่วคราว



มหาวิทยาลัยมหิดล


แนวทางเดินชั่วคราว  
โครงการก่อสร้าง  
Cover way ระยะที่ 2

แนวกันรั้วชั่วคราว

แนวทางเดินชั่วคราว

ทิศทางการเดิน


มีรูปภาพเพิ่มเติม

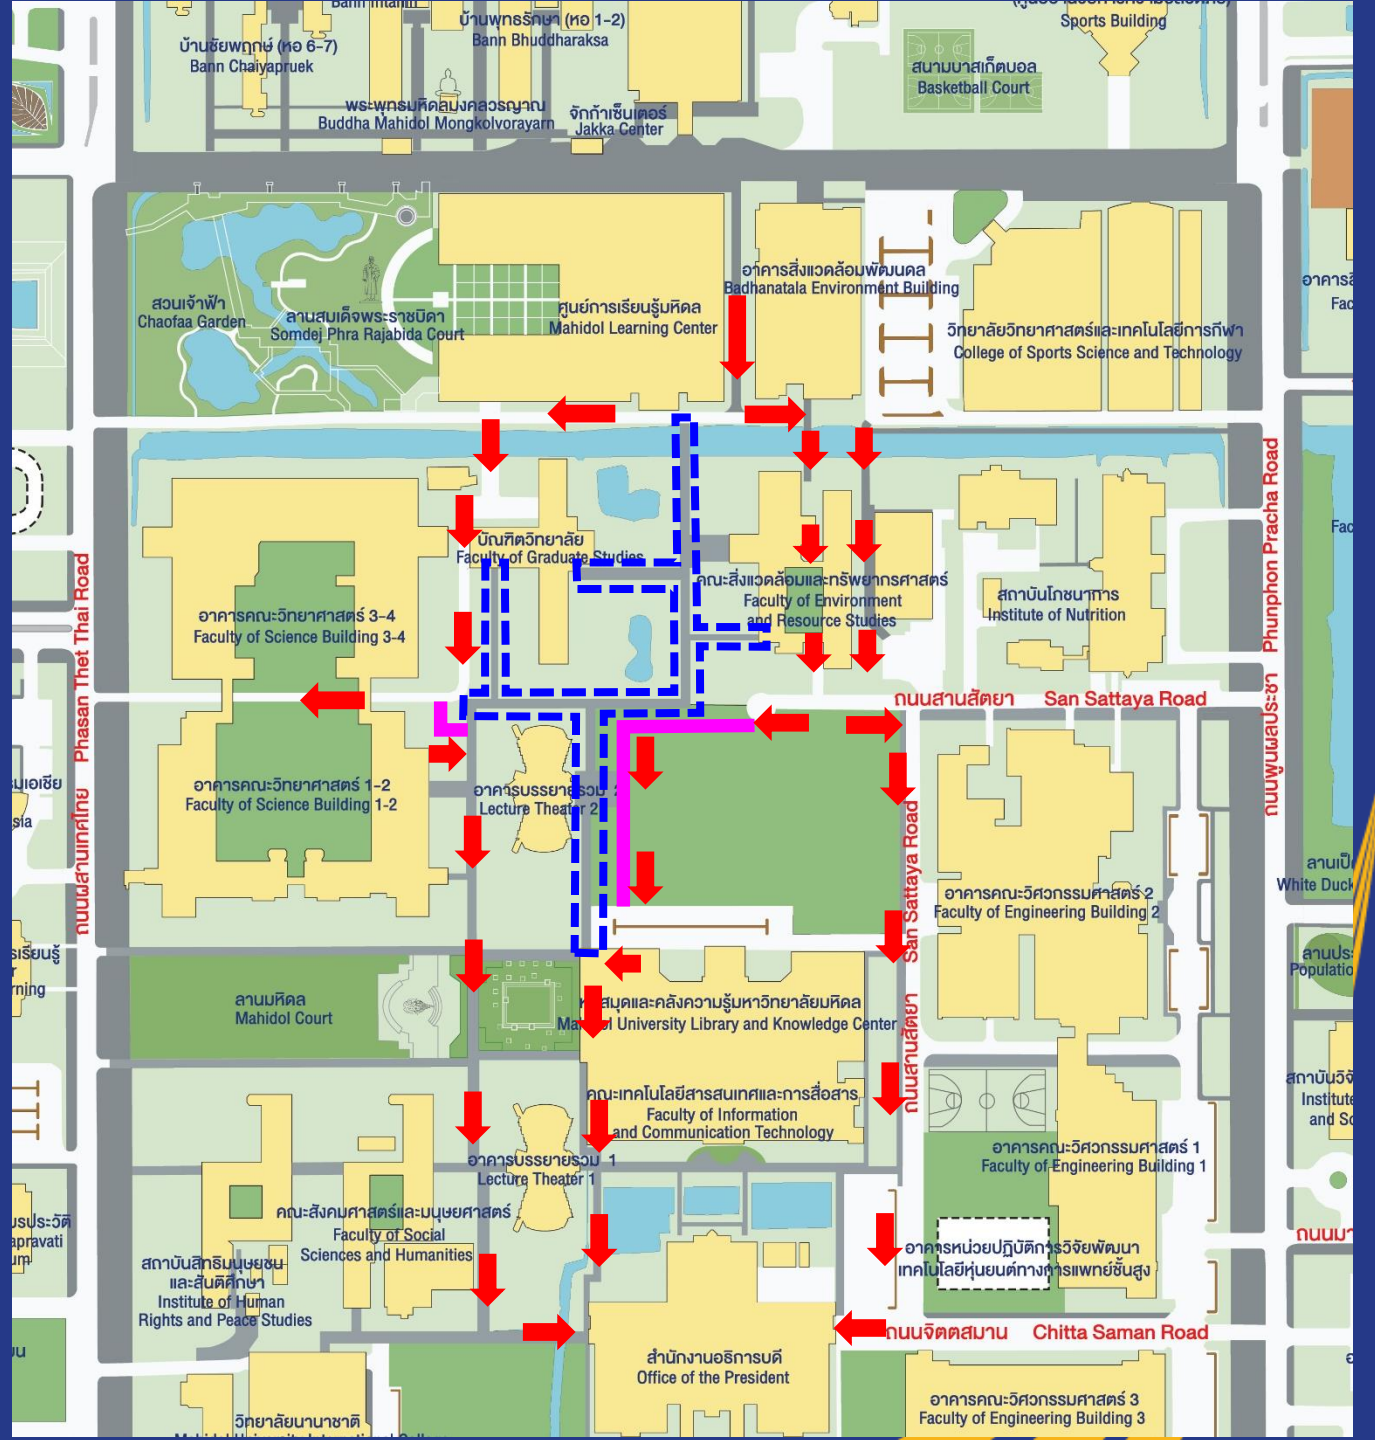



มหาวิทยาลัยมหิดล

# ผลกระทบต่อร้านค้าและร้านอาหาร

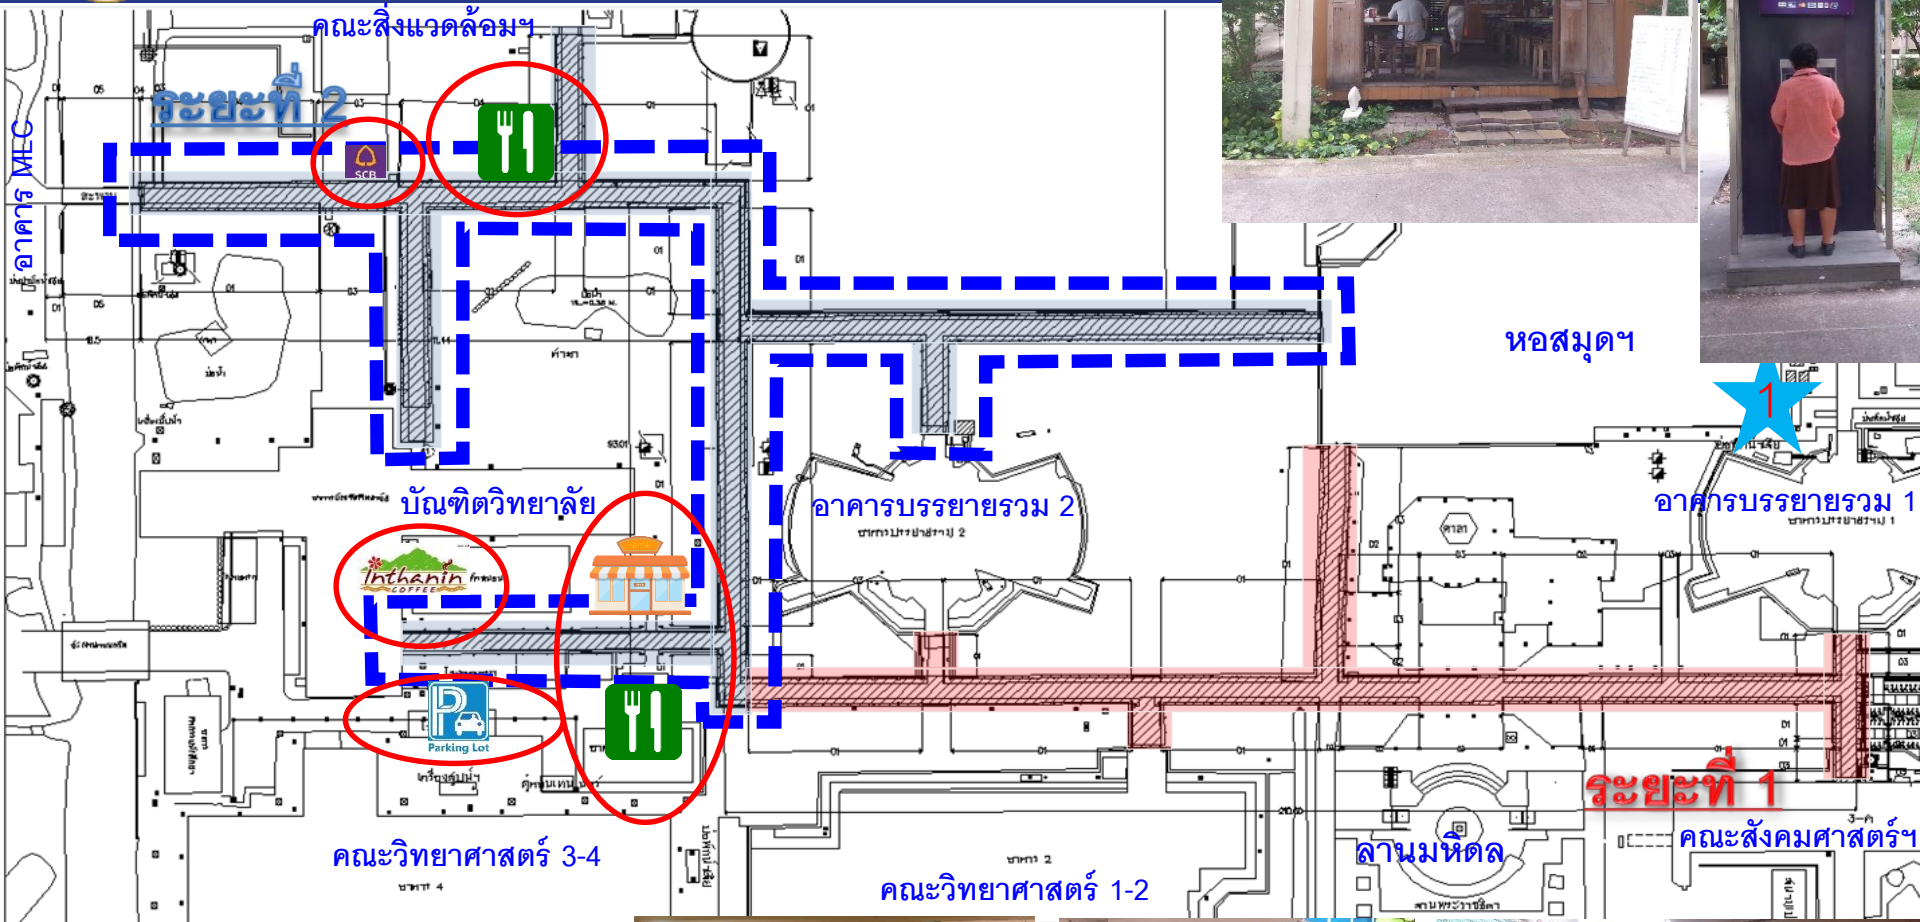

หอสมุดฯ



มีปัญหาคอ



มหาวิทยาลัยมหิดล

จบการนำเสนอ ขอขอบคุณครับ

