



มหาวิทยาลัยมหิดล
มโหฬารราชวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงกำแพงกันน้ำ บริเวณ MU Corner แล้วเสร็จ

งานออกแบบและฝังแม่บท




นำเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดโครงการ

1. ขอบตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท
2. วงเงินจัดจ้าง	1,260,000 บาท
3. สัญญาจ้าง	สัญญาเริ่ม 10 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุด 6 พฤศจิกายน 2566 (120 วัน)
4. ผู้รับจ้าง	บริษัท เค ดีวี เดเวลอปเมนต์ จำกัด
5. ระยะเวลาก่อสร้าง	120 วัน
6. ผลการดำเนินงาน	ณ ปัจจุบัน ประมาณ 100% (ผนัง ค.ส.ล. ยาวประมาณ 87 เมตร)
7. ผลสำเร็จที่ได้รับ	ได้กำแพงกันน้ำบริเวณ MU CORNER

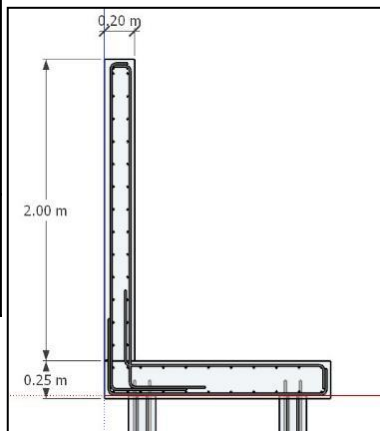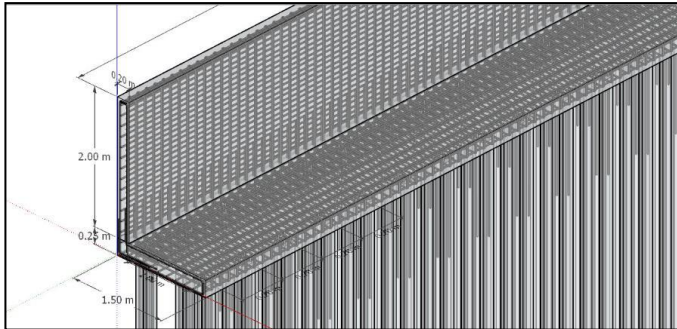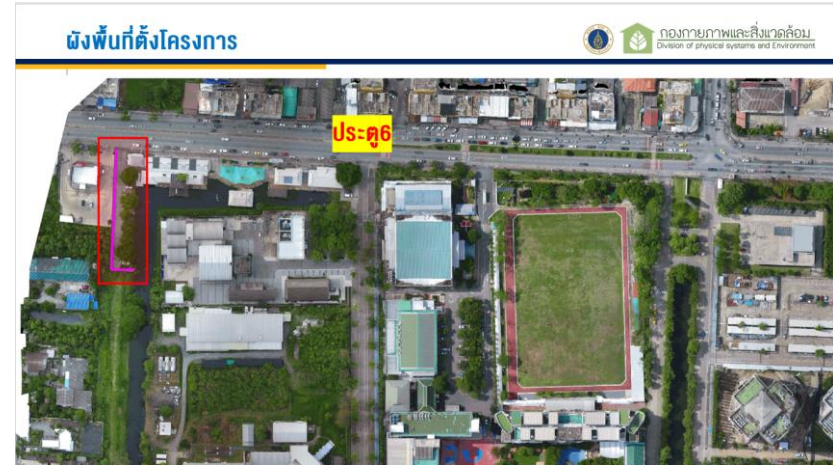



รูปน้ำท่วมปีช่วงปี 2554

รูปก่อนปรับปรุง

รูปหลังปรับปรุง



จบการนำเสนอ
